





Tocoman Aikataulu 3.0 -pikaohje

tuki@tocoman.com


Käyttöohje




Sarakkeiden lisääminen/piilottaminen/siirtäminen vasemmalle tai oikealle
Rivien lisääminen/poistaminen/siirtäminen ylös tai alas



Aika-alueen zoomaus




Janoille hierarkia- tai rivikohtainen tyyli

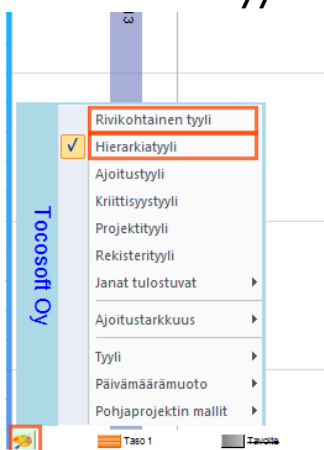

Janojen tyylien muokkaus (hierarkiatyyli)



Janojen tyylien muokkaus (rivikohtainen tyyli)



Tehtävä, jonka kesto on nolla, näytetään symbolina.

Tulostaminen: Tiedostovalikossa *Tulosta* > **Esikatselu**


JANAKAAVION LAATIMINEN

1. Syötä tehtävätaulukossa tehtävien tiedot (nimi, kesto...)

Janakaavio		Janakaavio (tarkka)	Paikka-aikakaavio	Resurssit	Resurssikuormitus	Seura
	Hier	Nimi	Kesto	Aik. alku	Toukokuu	
					20	21
1	1	Anturat	5 pv	20.05.13	1	
2	2	Muottityö	7 pv	20.05.13	2	
3	3	Raudoitus	3 pv	20.05.13	3	
4	4	Betonointi	2 pv	20.05.13	4	

2. Määritä tehtävien hierarkiatasot

- summatehtävien kesto lasketaan alatehtävien perusteella

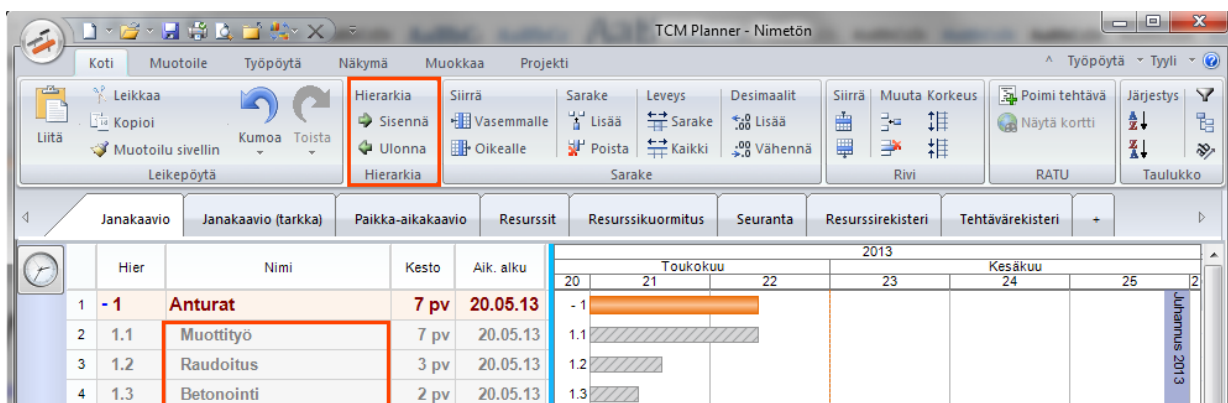

Janakaavio		Janakaavio (tarkka)	Paikka-aikakaavio	Resurssit	Resurssikuormitus	Seuranta	Resurssirekisteri	Tehtävärekisteri
	Hier	Nimi	Kesto	Aik. alku	2013			
					Toukokuu			Kesäkuu
					20	21	22	23
1	- 1	Anturat	7 pv	20.05.13	- 1			
2	1.1	Muottityö	7 pv	20.05.13	1.1			
3	1.2	Raudoitus	3 pv	20.05.13	1.2			
4	1.3	Betonointi	2 pv	20.05.13	1.3			

3. Ajoita tehtävät (siirrä janaa kaavioalueella hiirellä, syötä pvm taulukossa tai valitse pvm kalenterista klikkaamalla kaksi kertaa hitaasti pvm-solua)

Janakaavio		Janakaavio (tarkka)	Paikka-aikakaavio	Resurssit	Resurssikuormitus	Seuranta	Resurssirekisteri	
	Hier	Nimi	Kesto	Aik. alku	2013			
					Toukokuu			
					20	21	22	23
1	- 1	Anturat	12 pv	20.05.13	- 1			
2	1.1	Muottityö	7 pv	20.05.13	1.1			
3	1.2	Raudoitus	3 pv	29.05.13			1.2	
4	1.3	Betonointi	2 pv	03.06.13				1.3

- Voit määrittää myös riippuvuuksia tehtävien välille; *Muokkaa* > **Riippuvuus**)

4. Tulosta aikataulu

